

OSIEDLE BODZÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA HARMONOGRAM PRAC

ZADANIE 1

Budowa rurociągu tłocznego oraz pompowni P1 w ul. Widłakowej

realizacja 2017

ZADANIE 2 (a, b)

Budowa kanału grawitacyjnego wzdłuż istniejącej zabudowy w ul. Widłakowej od pompowni P1 w kierunku ośrodka Mari Teresy. Zadanie w trakcie projektowania. Pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) **rok 2017 -2018**

realizacja 2018-2019

ZADANIE 3

Budowa kanału grawitacyjnego w ul. Wielkanocnej od pompowni P1 wysokości budynku nr 40. Zlecenie projektowania i pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) **rok 2018.**

realizacja 2019-2020

ZADANIE 4

Budowa kanału grawitacyjnego i rurociągu tłocznego w ul. Wielkanocnej od pompowni P1 w kierunku wschodnim. Zlecenie projektowania i pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) **rok 2019.**

realizacja 2020-2021

ZADANIE 5

Pozostałe kanały grawitacyjne w ul. Wielkanocnej w kierunku zachodnim. Zlecenie projektowania i pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) **rok 2020.**

realizacja 2021

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Senderek

OSIEDLE BODZÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA HARMONOGRAM PRAC

ZADANIE 1

Budowa kanału grawitacyjnego od istniejącej pompowni „Widłakowa” do ul. Bodzowskiej (na wysokość ul. Nierównej). Zadanie w trakcie projektowania. Pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) **rok 2017 -2018**

realizacja 2019-2020

ZADANIE 2

Budowa kanału grawitacyjnego, rurociągu tłoczego oraz pompowni „Wielkanocna 2”. Zadanie w trakcie projektowania. Pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) **rok 2018**

realizacja 2020-2021

ZADANIE 3

Kontynuacja budowy kanału grawitacyjnego w ul. Nierównej i ul. Wielkanocnej od pompowni „Wielkanocna 2”. Zlecenie projektowania i pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) **rok 2018-2019.**

realizacja 2020-2021

ZADANIE 4

Budowa kanału grawitacyjnego w ul. Wielkanocnej i ul. Widłakowej pozostałe odcinki skierowane do systemu wschodniej części Bodzowa. Zlecenie projektowania i pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę (PNB) **rok 2019-2020.**

realizacja 2021-2022

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Senderek

BODZÓW

Legenda

- Istniejąca sieć kanalizacyjna
- Budynki
- Pompy
- Granica obszaru

CZĘŚĆ ZACHODNIA

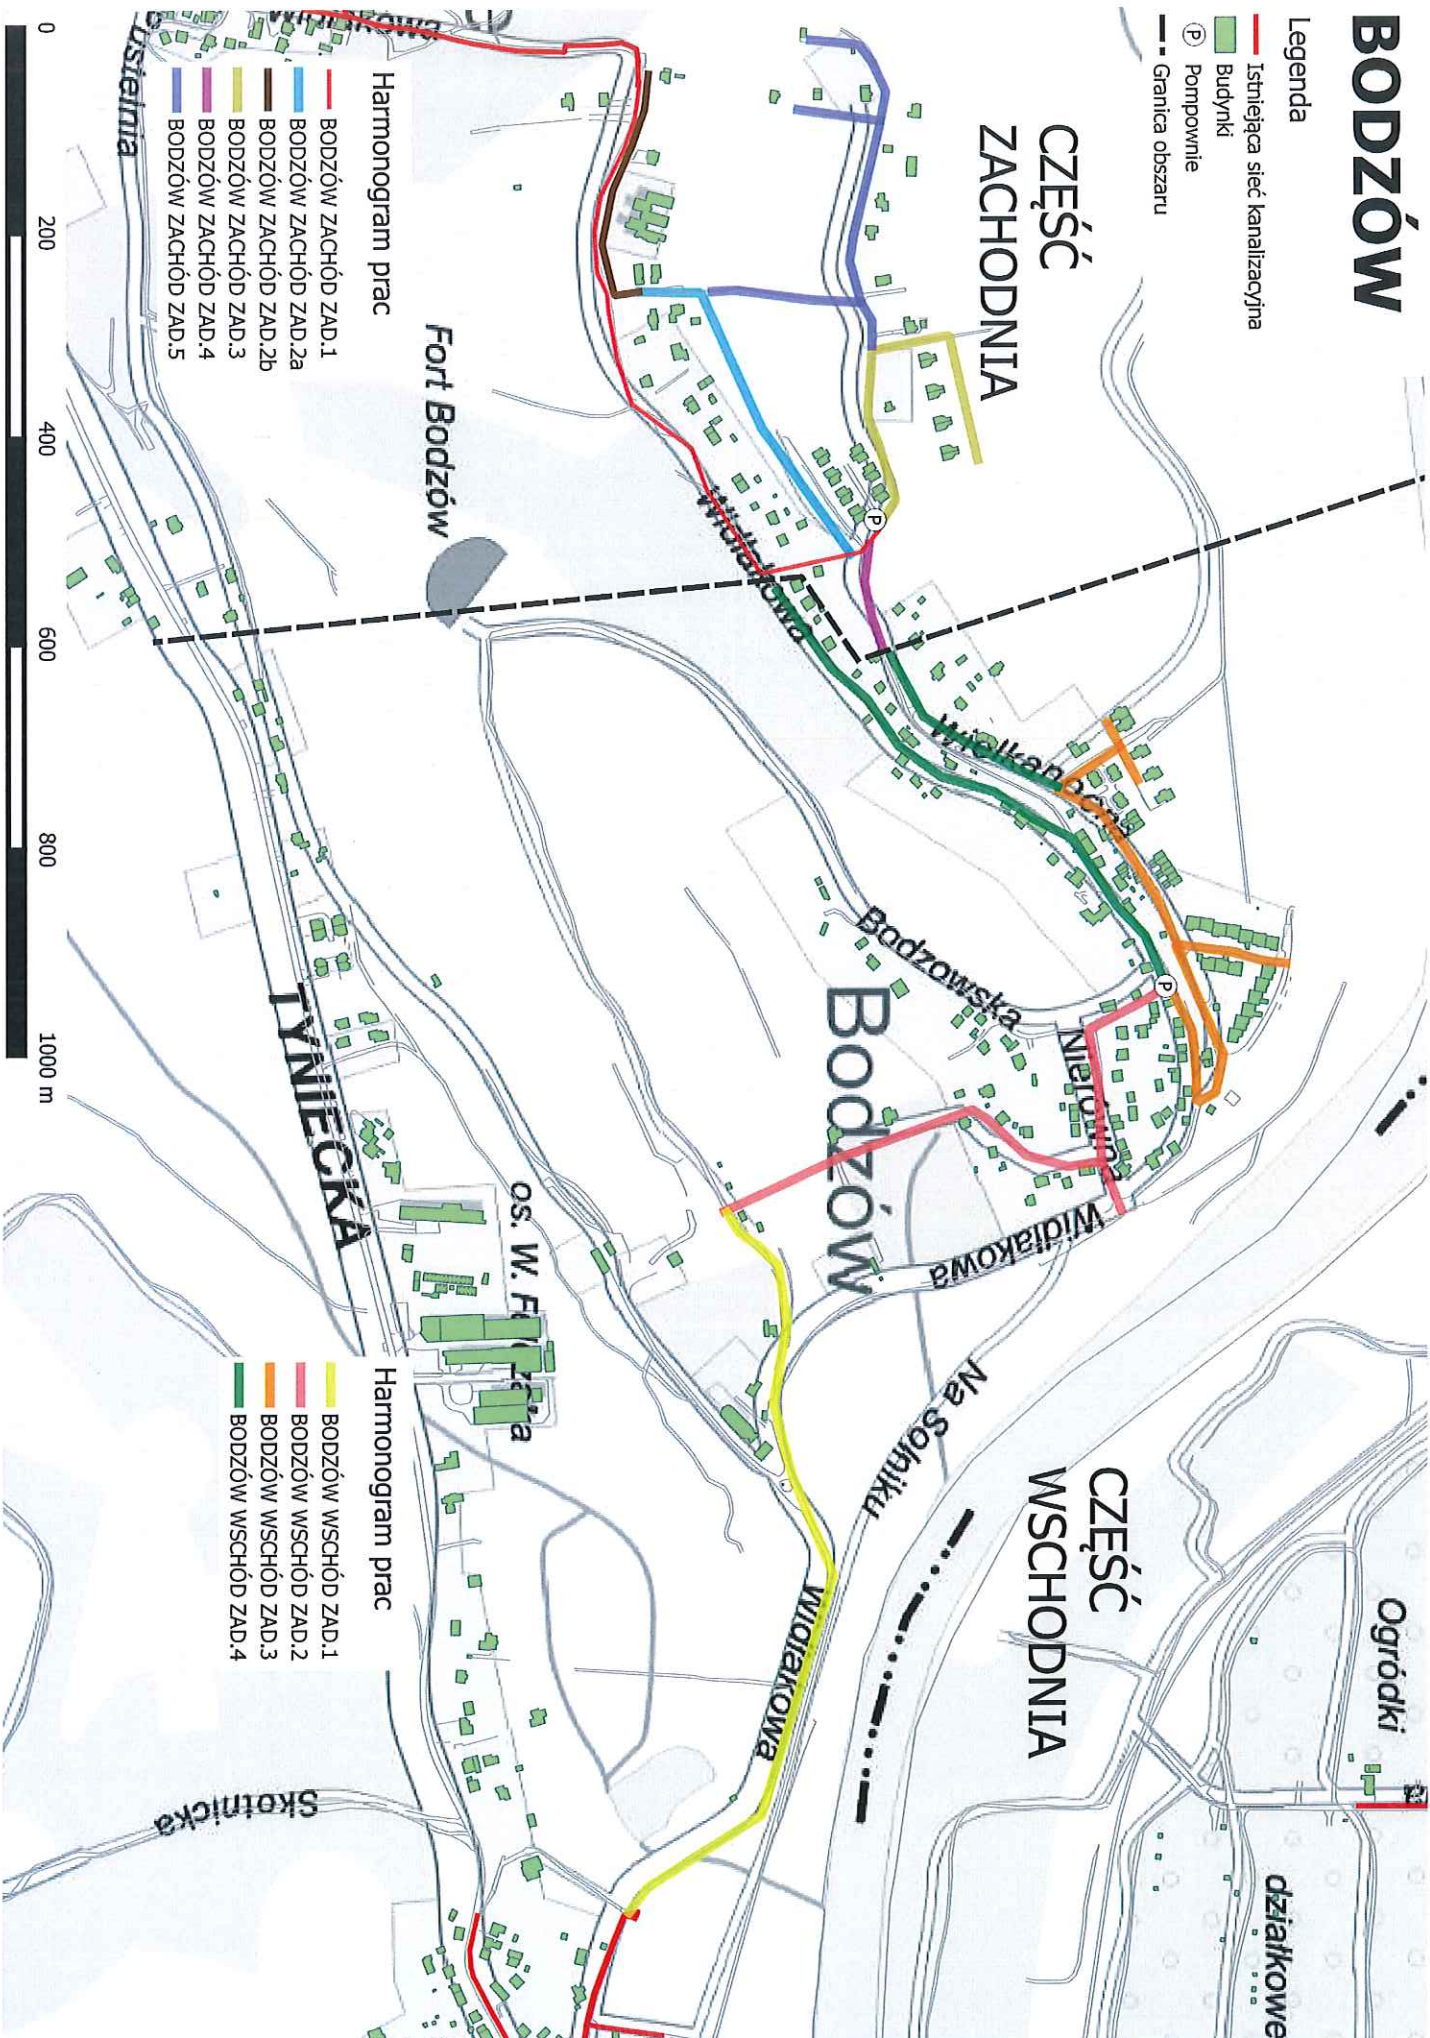

CZĘŚĆ WSCHODNIA

Harmonogram prac

- BODZÓW WSCHÓD ZAD.1
- BODZÓW WSCHÓD ZAD.2
- BODZÓW WSCHÓD ZAD.3
- BODZÓW WSCHÓD ZAD.4
